ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	Budget	1 day?	Thu 10/1/15	Thu 10/1/15
2	Kick-off Meeting	22 days?	Thu 10/1/15	Fri 10/30/15
3	Condition Survey(s)	44 days?	Mon 11/2/15	Thu 12/31/15
4	Sediment Sampling	101 days	Thu 10/1/15	Thu 2/18/16
5	Environmental Coordination	131 days	Thu 10/1/15	Thu 3/31/16
6	Plans & Specs	88 days?	Tue 12/1/15	Thu 3/31/16
7	Solicitation & Award	65 days?	Fri 4/1/16	Thu 6/30/16
8	Dredging	109 days?	Fri 7/1/16	Wed 11/30/16
9	Closeout	65 days?	Thu 12/1/16	Wed 3/1/17

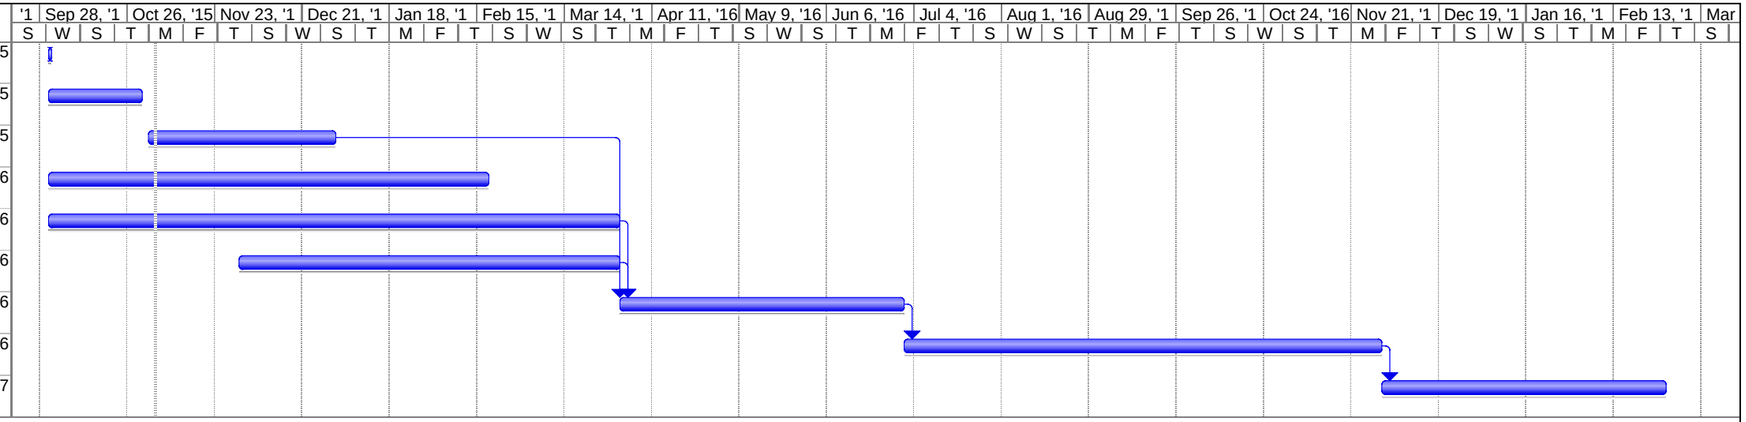

Pre-Award - 9 months

Long Term Management Plan - On-going; starts up to 5 years in advance

Construction - 2 to 6 months

Post-Construction - 3 months

Project: Generic Dredge Schedule
Date: Wed 11/4/15

Task | Progress | Summary | External Tasks | Deadline

Split | Milestone | Project Summary | External Milestone
